



















N°	PAIMAS Id	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseur	% achevé	Noms ressources	
1		Projet d'archives <PROJET>	106 jours	Lun 04/01/10	Lun 31/05/10		0%		S
2		Phase préliminaire	43 jours	Lun 04/01/10	Mer 03/03/10		0%		
3		Prise de contact	4 jours	Lun 04/01/10	Jeu 07/01/10		0%		
4	P-1	Identification des contacts et de l'organigramme de travail	2 jours	Lun 04/01/10	Mar 05/01/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
5	P-2	Echange d'information	2 jours	Mer 06/01/10	Jeu 07/01/10	4	0%	Service Versant[50%];Service d	
6		Définition préliminaire, étude de faisabilité	33 jours	Ven 08/01/10	Mar 23/02/10	3	0%		
7		Information à archiver	9 jours	Ven 08/01/10	Mer 20/01/10		0%		
8	P-3	Identification du Contenu d'Information à préserver	5 jours	Ven 08/01/10	Jeu 14/01/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
9	P-4	Identification d'information complémentaires	2 jours	Ven 15/01/10	Lun 18/01/10	8	0%	Service Versant[50%];Service d	
10	P-5	Identification de la communauté d'utilisateurs	1 jour	Ven 08/01/10	Ven 08/01/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
11	P-6	Définition des règles d'accès à l'information	3 jours	Lun 11/01/10	Mer 13/01/10	10	0%	Service Versant[50%];Service d	
12	P-7	Estimation de la durée de conservation par le service d'archives	1 jour	Mar 19/01/10	Mar 19/01/10	8;9;10;11	0%	Service Versant[50%];Service d	
13	P-8	Estimation de la faisabilité et des coûts	1 jour	Mer 20/01/10	Mer 20/01/10	12	0%	Service Versant[50%];Service d	
14		Objets numériques	11 jours	Jeu 21/01/10	Jeu 04/02/10	7	0%		
15	P-9	Identification préliminaire des Objets-donnée associés aux différentes c	5 jours	Jeu 21/01/10	Mer 27/01/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
16	P-10	Définition des règles et standards associés acceptés par le Service d'A	1 jour	Jeu 28/01/10	Jeu 28/01/10	15	0%	Service d'Archives	
17	P-11	Description des outils disponibles pour application des règles et standa	1 jour	Ven 29/01/10	Ven 29/01/10	16	0%	Service d'Archives	
18	P-12	Définition des règles et standards appliqués aux objets par le Service V	1 jour	Jeu 28/01/10	Jeu 28/01/10	15	0%	Service Versant	
19	P-13	Description des outils disponibles pour application des règles et standa	1 jour	Ven 29/01/10	Ven 29/01/10	18	0%	Service Versant	
20	P-14	Estimation la compatibilité, les conflits, étude de solutions	3 jours	Lun 01/02/10	Mer 03/02/10	17;19	0%	Service Versant[50%];Service d	
21	P-15	Estimation des changements requis et des coûts	1 jour	Jeu 04/02/10	Jeu 04/02/10	20	0%	Service Versant[50%];Service d	
22		Références et standards	8 jours	Ven 08/01/10	Mar 19/01/10		0%		
23	P-16	Inventaire des règles ou nomenclatures sur les Informations de représe	5 jours	Ven 08/01/10	Jeu 14/01/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
24	P-17	Définition des règles ou nomenclatures pertinentes pour le projet d'arch	2 jours	Ven 15/01/10	Lun 18/01/10	23	0%	Service Versant[50%];Service d	
25	P-18	Estimation des coûts associés	1 jour	Mar 19/01/10	Mar 19/01/10	24	0%	Service Versant	
26		Volumétrie	6 jours	Ven 05/02/10	Ven 12/02/10	14	0%		
27	P-19	Estimation du volume de données à transférer au Service d'Archives	2 jours	Ven 05/02/10	Lun 08/02/10		0%	Service Versant	
28	P-20	Estimation du volume global de données à stocker	2 jours	Mar 09/02/10	Mer 10/02/10	27	0%	Service d'Archives	
29	P-21	Estimer la capacité de stockage nécessaire pour le processus d'Entrée	1 jour	Jeu 11/02/10	Jeu 11/02/10	28	0%	Service d'Archives	
30	P-22	Estimer les coûts associés	1 jour	Ven 12/02/10	Ven 12/02/10	29	0%	Service d'Archives	
31		Sécurité	5 jours	Ven 08/01/10	Jeu 14/01/10		0%		
32	P-23	Identifier les besoins pour la confidentialité et l'authentification lors du tr	3 jours	Ven 08/01/10	Mar 12/01/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
33	P-24	Identifier les besoins pour la sécurité du stockage dans le système d'arc	3 jours	Ven 08/01/10	Mar 12/01/10		0%	Service d'Archives	
34	P-25	Identifier les besoins pour la confidentialité et l'authentification lors du tr	3 jours	Ven 08/01/10	Mar 12/01/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
35	P-26	Identifier les standards et outils à utiliser	1 jour	Mer 13/01/10	Mer 13/01/10	34;32;33	0%	Service Versant[50%];Service d	
36	P-27	Estimer les coûts associés	1 jour	Jeu 14/01/10	Jeu 14/01/10	35	0%	Service Versant[50%];Service d	
37		Aspects contractuels et légaux	8 jours	Ven 08/01/10	Mar 19/01/10		0%		

Projet : PAIMAS_Planning_phases Date : Jeu 07/10/10	Tâche		Jalon		Tâches externes	
	Fractionnement		Récapitulative		Jalons externes	
	Avancement		Récapitulatif du projet		Échéance	

N°	PAIMAS Id	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseur	% achevé	Noms ressources	
38	P-28	Définition des la nature des relations entre le Service Versant et le Serv	5 jours	Ven 08/01/10	Jeu 14/01/10		0%	Service Versant[50%];Service d	S
39	P-29	Evaluation du problème de la propriété intellectuelle	5 jours	Ven 08/01/10	Jeu 14/01/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
40	P-30	Définition des conditions d'accès aux données	5 jours	Ven 08/01/10	Jeu 14/01/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
41	P-31	Certification du Service d'Archives	2 jours	Ven 08/01/10	Lun 11/01/10		0%	Service d'Archives	
42	P-32	Définition des standards et outils à utiliser	2 jours	Ven 15/01/10	Lun 18/01/10	38;39;41	0%	Service Versant[50%];Service d	
43	P-33	Estimation des coûts associés	1 jour	Mar 19/01/10	Mar 19/01/10	42	0%	Service Versant[50%];Service d	
44		Protocole de transfert	8 jours	Ven 08/01/10	Mar 19/01/10		0%		
45	P-34	Définition préliminaire des SIP	5 jours	Ven 08/01/10	Jeu 14/01/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
46	P-35	Echange des besoins et contraintes de transfert	2 jours	Ven 15/01/10	Lun 18/01/10	45	0%	Service Versant[50%];Service d	
47	P-36	Estimation des coûts associés	1 jour	Mar 19/01/10	Mar 19/01/10	46	0%	Service Versant[50%];Service d	
48		Critères de validation	8 jours	Ven 08/01/10	Mar 19/01/10		0%		
49	P-37	Communication au Service Versant des critères de validation du SIP, p	2 jours	Ven 08/01/10	Lun 11/01/10		0%	Service d'Archives	
50	P-38	Analyse des changements ou développements requis pour la validati	5 jours	Mar 12/01/10	Lun 18/01/10	49	0%	Service d'Archives	
51	P-39	Analyse des méthodes qualité à implementer pour répondre aux besoin	5 jours	Mar 12/01/10	Lun 18/01/10	49	0%	Service Versant	
52	P-40	Estimation des coûts associés	1 jour	Mar 19/01/10	Mar 19/01/10	50;51	0%	Service Versant[50%];Service d	
53		Calendrier	3 jours	Ven 08/01/10	Mar 12/01/10		0%		
54	P-41	Mise au point d'un calendrier préliminaire	3 jours	Ven 08/01/10	Mar 12/01/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
55		Impact sur le système d'archives	5 jours	Ven 08/01/10	Jeu 14/01/10		0%		
56	P-42	Estimation des impacts à venir pour le Service d'Archives	5 jours	Ven 08/01/10	Jeu 14/01/10		0%	Service d'Archives	
57		Résumé des coûts, risques	5 jours	Lun 15/02/10	Ven 19/02/10	7;14;22;26;3	0%		
58	P-43	Production d'un résumé des coûts et des risques identifiés	5 jours	Lun 15/02/10	Ven 19/02/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
59		Points critiques	2 jours	Lun 22/02/10	Mar 23/02/10	57	0%		
60	P-44	Identification des points critiques susceptibles de faire échouer le projet	2 jours	Lun 22/02/10	Mar 23/02/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
61		Etablissement d'un accord préliminaire	6 jours	Mer 24/02/10	Mer 03/03/10	3;6	0%		
62	P-45	Production d'un document résumant la phase préliminaire, avec estimation c	5 jours	Mer 24/02/10	Mar 02/03/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
63	P-46	Signature d'un accord préliminaire pour passer à la phase suivante	1 jour	Mer 03/03/10	Mer 03/03/10	62	0%	Service Versant[50%];Service d	
64		Accord préliminaire signé	0 jour	Mer 03/03/10	Mer 03/03/10	61	0%	Service Versant[50%];Service d	
65		Phase de définition	17 jours	Jeu 04/03/10	Ven 26/03/10	2	0%		
66		Organisation de la phase de définition formelle	2 jours	Jeu 04/03/10	Ven 05/03/10		0%		
67	F-1	Mise en place de l'équipe de gestion de la phase de définition formelle	1 jour	Jeu 04/03/10	Jeu 04/03/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
68	F-2	Spécifications des points à expliciter	1 jour	Ven 05/03/10	Ven 05/03/10	67	0%	Service Versant[50%];Service d	
69		Définition formelle	13 jours	Ven 05/03/10	Mar 23/03/10	67	0%		
70		Contexte général du projet et des objets d'information	9 jours	Ven 05/03/10	Mer 17/03/10		0%		
71	F-3	Définition du contexte général du projet d'archives et de la liste des obje	3 jours	Ven 05/03/10	Mar 09/03/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
72	F-4	Définition des formats, règles d'encodage et standards appliqués aux c	3 jours	Mer 10/03/10	Ven 12/03/10	71	0%	Service Versant[50%];Service d	
73	F-5	Définition des indicateurs de volumétrie	3 jours	Mer 10/03/10	Ven 12/03/10	71	0%	Service Versant	
74	F-6	Définition des références pour les objets à archiver	2 jours	Mer 10/03/10	Jeu 11/03/10	71	0%	Service Versant[50%];Service d	

Projet : PAIMAS_Planning_phases
Date : Jeu 07/10/10

Tâche		Jalon		Tâches externes	
Fractionnement		Récapitulative		Jalons externes	
Avancement		Récapitulatif du projet		Échéance	

N°	PAIMAS Id	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseur	% achevé	Noms ressources	
75	F-7	Choix des outils	1 jour	Lun 15/03/10	Lun 15/03/10	72;73;74	0%	Service Versant[50%];Service d	S
76	F-8	Documentation des Objets-information (Objets-donnée + Information de	2 jours	Mar 16/03/10	Mer 17/03/10	75	0%	Service Versant[50%];Service d	
77		Dictionnaire de données	8 jours	Ven 05/03/10	Mar 16/03/10		0%		
78	F-9	Définition des classes d'objet et leurs attributs, du Dictionnaire des doni	3 jours	Ven 05/03/10	Mar 09/03/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
79	F-10	Implémentation du Dictionnaire des données	5 jours	Mer 10/03/10	Mar 16/03/10	78	0%	Service d'Archives	
80		Modèle formel	6 jours	Ven 05/03/10	Ven 12/03/10		0%		
81	F-11	Définition des différentes instances des Objets-donnée	3 jours	Ven 05/03/10	Mar 09/03/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
82	F-12	Représentation du modèle	3 jours	Mer 10/03/10	Ven 12/03/10	81	0%	Service d'Archives	
83		Aspects contractuels et légaux	2 jours	Ven 05/03/10	Lun 08/03/10		0%		
84	F-13	Etablissement d'un accord sur les aspects contractuels et légaux relatif:	2 jours	Ven 05/03/10	Lun 08/03/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
85		Protocole de transfert	10 jours	Ven 05/03/10	Jeu 18/03/10		0%		
86	F-14	Définition des procédures de communication (réseau, protocoles, médi	5 jours	Ven 05/03/10	Jeu 11/03/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
87	F-15	Définition de l'Information d'empaquetage des données transférées	5 jours	Ven 05/03/10	Jeu 11/03/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
88	F-16	Définition de la session de transfert	5 jours	Ven 05/03/10	Jeu 11/03/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
89	F-17	Définition du test initial de transfert	5 jours	Ven 05/03/10	Jeu 11/03/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
90	F-18	Identification des outils à utiliser pendant la phase de transfert	3 jours	Ven 05/03/10	Mar 09/03/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
91	F-19	Description des procédures de transfert	5 jours	Ven 12/03/10	Jeu 18/03/10	86;87;88;89	0%	Service d'Archives	
92		Critères de validation	13 jours	Ven 05/03/10	Mar 23/03/10		0%		
93	F-20	Définition des validations systématique à la réception des Objets	2 jours	Ven 05/03/10	Lun 08/03/10		0%	Service d'Archives	
94	F-21	Définition détaillée des contrôles	5 jours	Mar 09/03/10	Lun 15/03/10	93	0%	Service d'Archives	
95	F-22	Définition des procédures pour le rejet, re-transfert, acceptation des Ob	2 jours	Mar 16/03/10	Mer 17/03/10	94	0%	Service Versant[50%];Service d	
96	F-23	Définition du test initial de la validation	1 jour	Jeu 18/03/10	Jeu 18/03/10	95	0%	Service Versant[50%];Service d	
97	F-24	Identification des outils de validation	1 jour	Jeu 18/03/10	Jeu 18/03/10	95	0%	Service d'Archives	
98	F-25	Documenter les procédures de validation	3 jours	Ven 19/03/10	Mar 23/03/10	96;97	0%	Service d'Archives	
99		Calendrier de livraison	3 jours	Ven 05/03/10	Mar 09/03/10		0%		
100	F-26	Définition d'un calendrier de référence	2 jours	Ven 05/03/10	Lun 08/03/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
101	F-27	Définition des procédures de suivi en cas de délai	1 jour	Mar 09/03/10	Mar 09/03/10	100	0%	Service Versant[50%];Service d	
102		Gestion des changements	9 jours	Ven 05/03/10	Mer 17/03/10		0%		
103	F-28	Identification des origines et causes des changements	3 jours	Ven 05/03/10	Mar 09/03/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
104	F-29	Identification des scénarios pour l'implémentation des changements	3 jours	Mer 10/03/10	Ven 12/03/10	103	0%	Service Versant[50%];Service d	
105	F-30	Estimation du travail à effectuer, la faisabilité et les coûts pour chaque s	2 jours	Lun 15/03/10	Mar 16/03/10	104	0%	Service Versant[50%];Service d	
106	F-31	Décision pour l'implémentation des changements	1 jour	Mer 17/03/10	Mer 17/03/10	105	0%	Service Versant[50%];Service d	
107	F-32	Exécution du plan d'action	0 jour	Mer 17/03/10	Mer 17/03/10	106	0%	Service Versant[50%];Service d	
108		Faisabilité, risques et coûts	5 jours	Ven 05/03/10	Jeu 11/03/10		0%		
109	F-33	Validation de la faisabilité du projet	2 jours	Ven 05/03/10	Lun 08/03/10		0%	Service Versant[50%];Service d	
110	F-34	Evaluation des coûts pour le Service Versant et le Service d'Archives	3 jours	Mar 09/03/10	Jeu 11/03/10	109	0%	Service Versant[50%];Service d	
111	F-35	Estimation des risques	3 jours	Mar 09/03/10	Jeu 11/03/10	109	0%	Service Versant[50%];Service d	

Projet : PAIMAS_Planning_phases
Date : Jeu 07/10/10

Tâche		Jalon		Tâches externes	
Fractionnement		Récapitulative		Jalons externes	
Avancement		Récapitulatif du projet		Échéance	

N°	PAIMAS Id	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseur	% achevé	Noms ressources
112		Etablissement d'un accord de transfert	3 jours	Mer 24/03/10	Ven 26/03/10		0%	
113	F-36	Documentation de l'accord sur le transfert	3 jours	Mer 24/03/10	Ven 26/03/10	69	0%	Service Versant[50%];Service d
114		Accord de transfert signé	0 jour	Ven 26/03/10	Ven 26/03/10	112	0%	
115		Phase de transfert	25 jours	Lun 29/03/10	Ven 30/04/10	65	0%	
116		Exécution du test de transfert	5 jours	Lun 29/03/10	Ven 02/04/10		0%	
117	T-1	Exécution du test initial de transfert	5 jours	Lun 29/03/10	Ven 02/04/10		0%	Service Versant[50%];Service d
118		Gestion du transfert	20 jours	Lun 05/04/10	Ven 30/04/10		0%	
119	T-2	Contrôle de l'exécution correcte des opérations de transfert	20 jours	Lun 05/04/10	Ven 30/04/10	116	0%	Service Versant[50%];Service d
120		Test de transferts exécutés et validés	0 jour	Ven 30/04/10	Ven 30/04/10	116;118	0%	Service Versant[50%];Service d
121		Phase de validation	20 jours	Lun 03/05/10	Ven 28/05/10	115	0%	
122		Exécution du test de validation	5 jours	Lun 03/05/10	Ven 07/05/10		0%	
123	V-1	Exécution du test initial de validation	5 jours	Lun 03/05/10	Ven 07/05/10		0%	Service Versant[50%];Service d
124		Gestion de la validation	15 jours	Lun 10/05/10	Ven 28/05/10		0%	
125	V-2	Contrôle de la validité des Objets transférés	10 jours	Lun 10/05/10	Ven 21/05/10	122	0%	Service d'Archives
126	V-3	Echange des résultats	5 jours	Lun 24/05/10	Ven 28/05/10	125	0%	Service Versant[50%];Service d
127		Test de contrôle exécutés et validés	0 jour	Ven 28/05/10	Ven 28/05/10	122;124	0%	Service Versant[50%];Service d
128		Accord pour la mise en production du projet	1 jour	Lun 31/05/10	Lun 31/05/10	2;65;115;121	0%	Service Versant[50%];Service d

S

Projet : PAIMAS_Planning_phases
Date : Jeu 07/10/10

Tâche



Jalon



Tâches externes



Fractionnement



Récapitulative



Jalons externes



Avancement




Récapitulatif du projet



Échéance



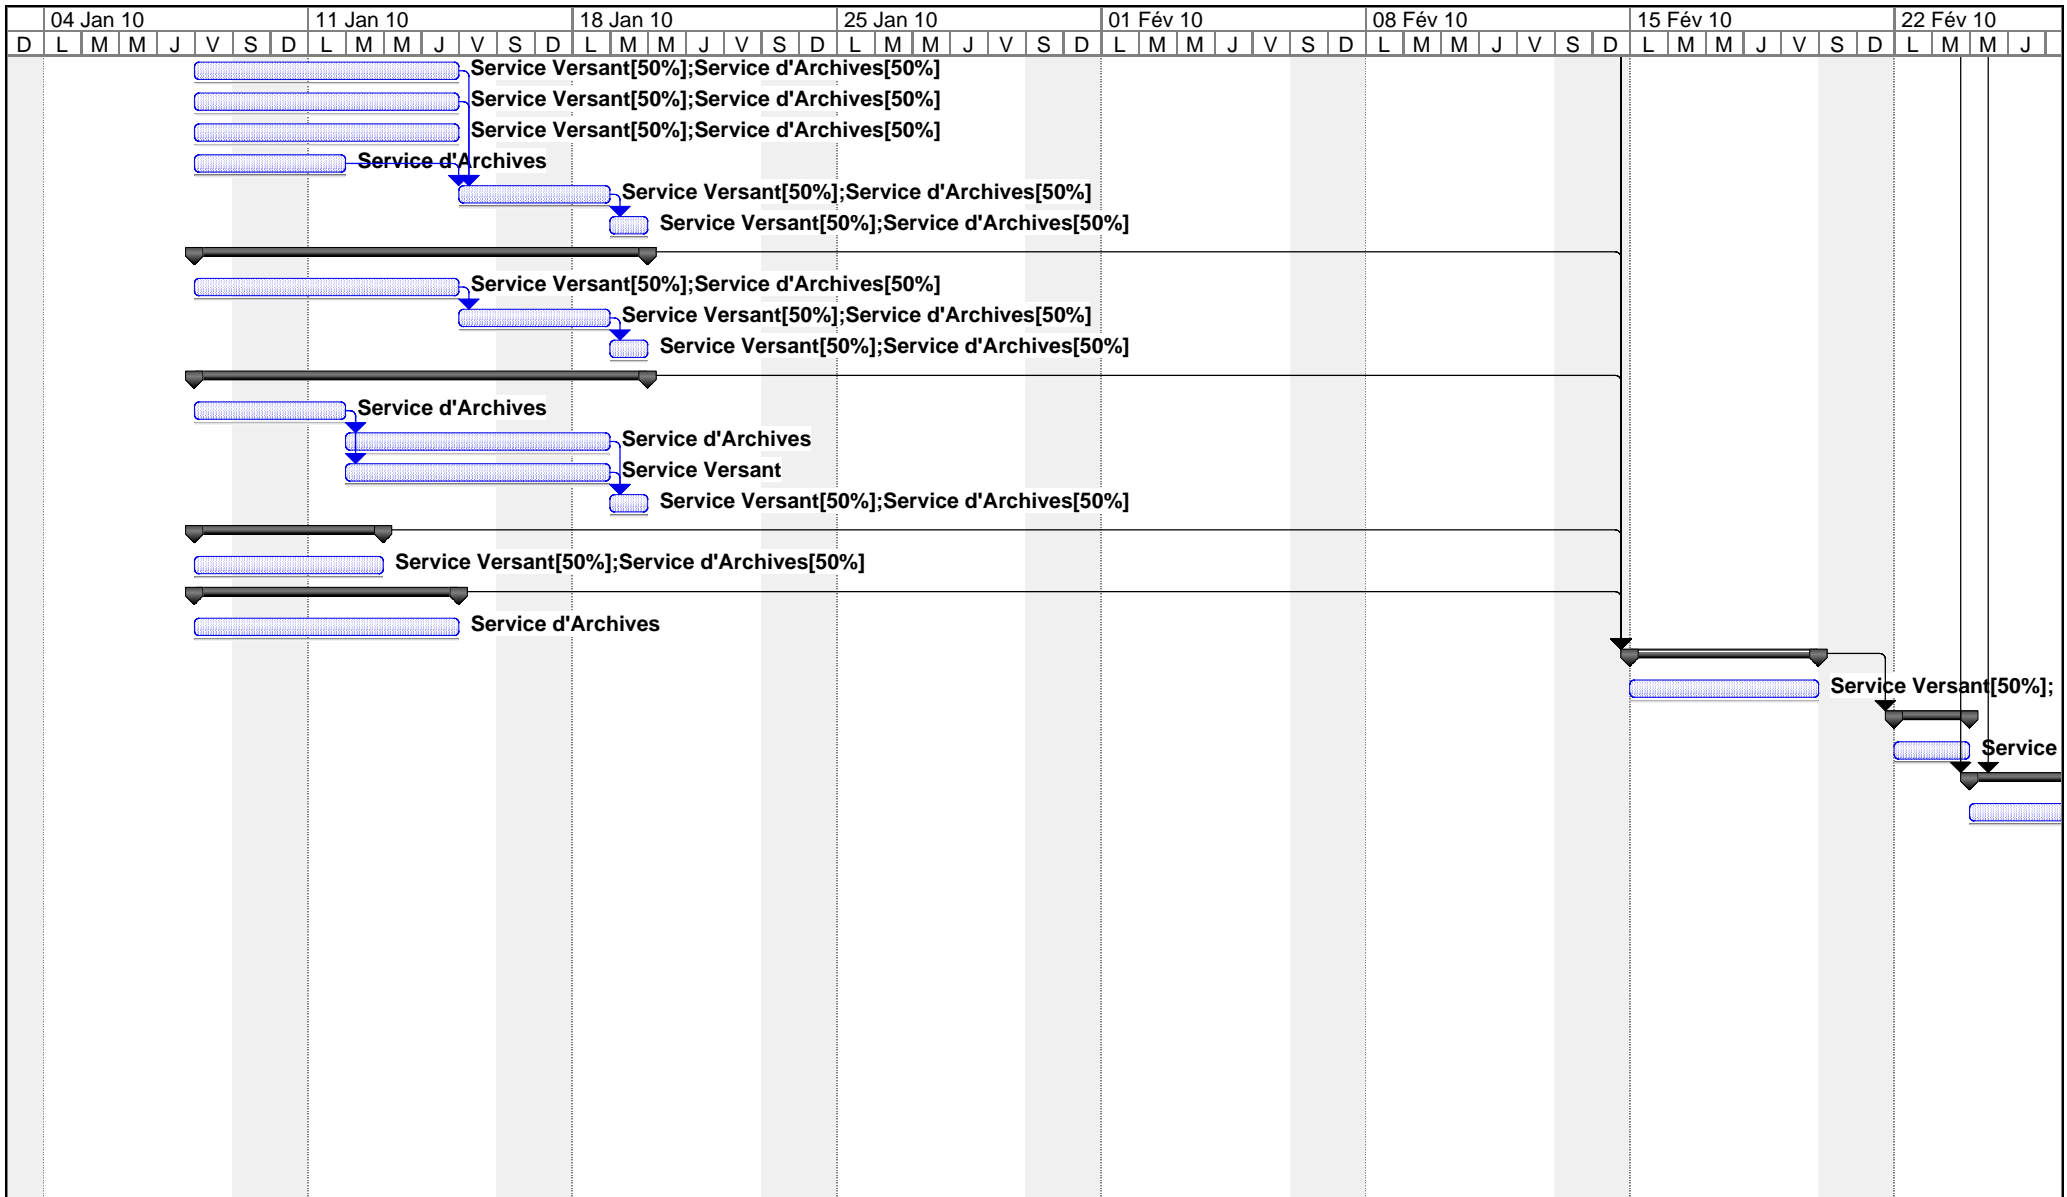

Projet : PAIMAS_Planning_phases Date : Jeu 07/10/10	Tâche		Jalon		Tâches externes	
	Fractionnement		Récapitulative		Jalons externes	
	Avancement		Récapitulatif du projet		Échéance	

04 Jan 10							11 Jan 10							18 Jan 10							25 Jan 10							01 Fév 10							08 Fév 10							15 Fév 10							22 Fév 10				
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J

Projet : PAIMAS_Planning_phases
Date : Jeu 07/10/10

Tâche



Jalon



Tâches externes



Fractionnement



Récapitulative



Jalons externes



Avancement




Récapitulatif du projet




Échéance









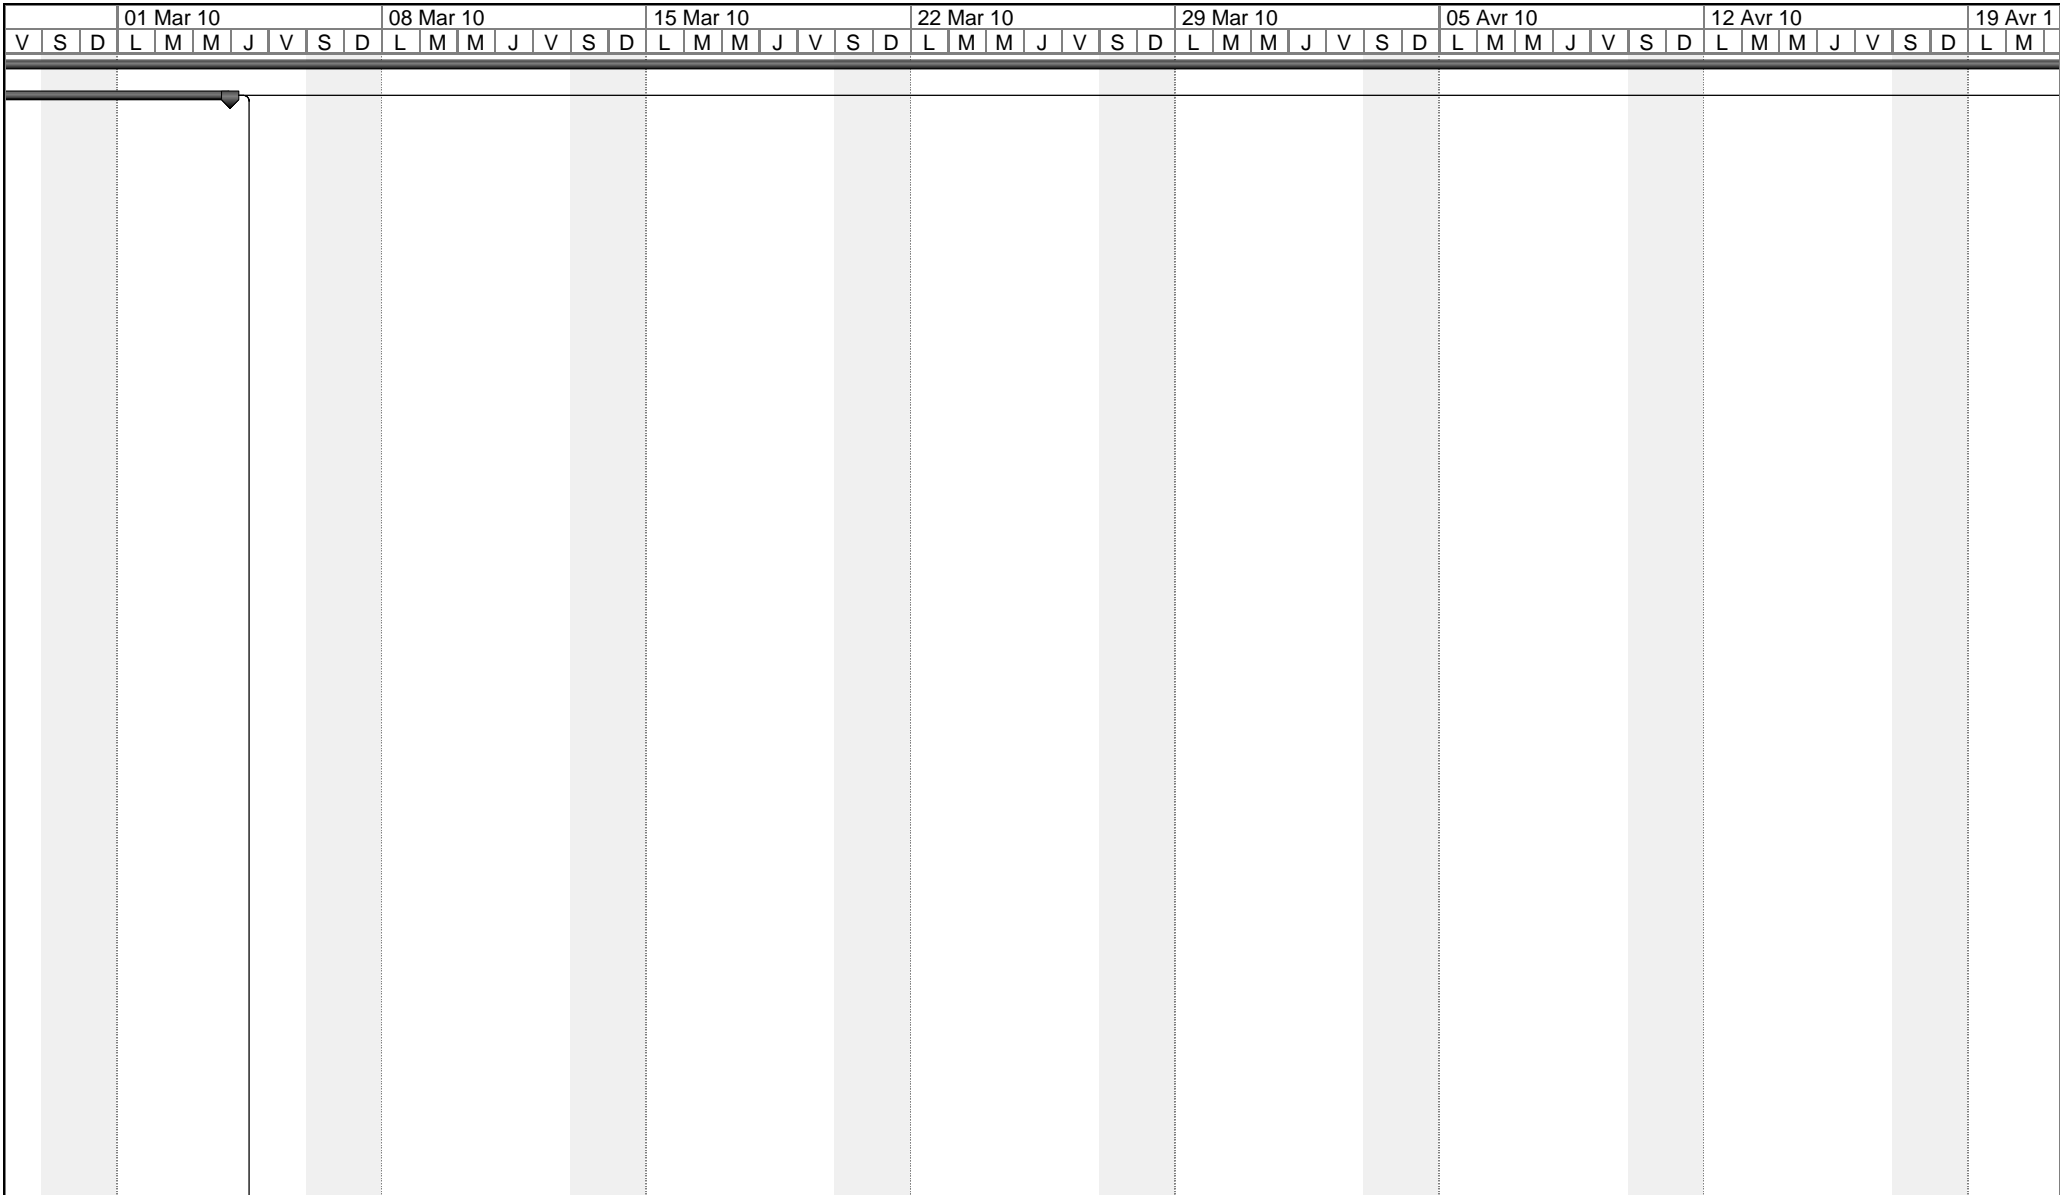


04 Jan 10							11 Jan 10							18 Jan 10							25 Jan 10							01 Fév 10							08 Fév 10							15 Fév 10							22 Fév 10				
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J




Projet : PAIMAS_Planning_phases Date : Jeu 07/10/10	Tâche		Jalon		Tâches externes	
	Fractionnement		Récapitulative		Jalons externes	
	Avancement		Récapitulatif du projet		Échéance	




Projet : PAIMAS_Planning_phases
 Date : Jeu 07/10/10

Tâche		Jalon		Tâches externes	
Fractionnement		Récapitulative		Jalons externes	
Avancement		Récapitulatif du projet		Échéance	

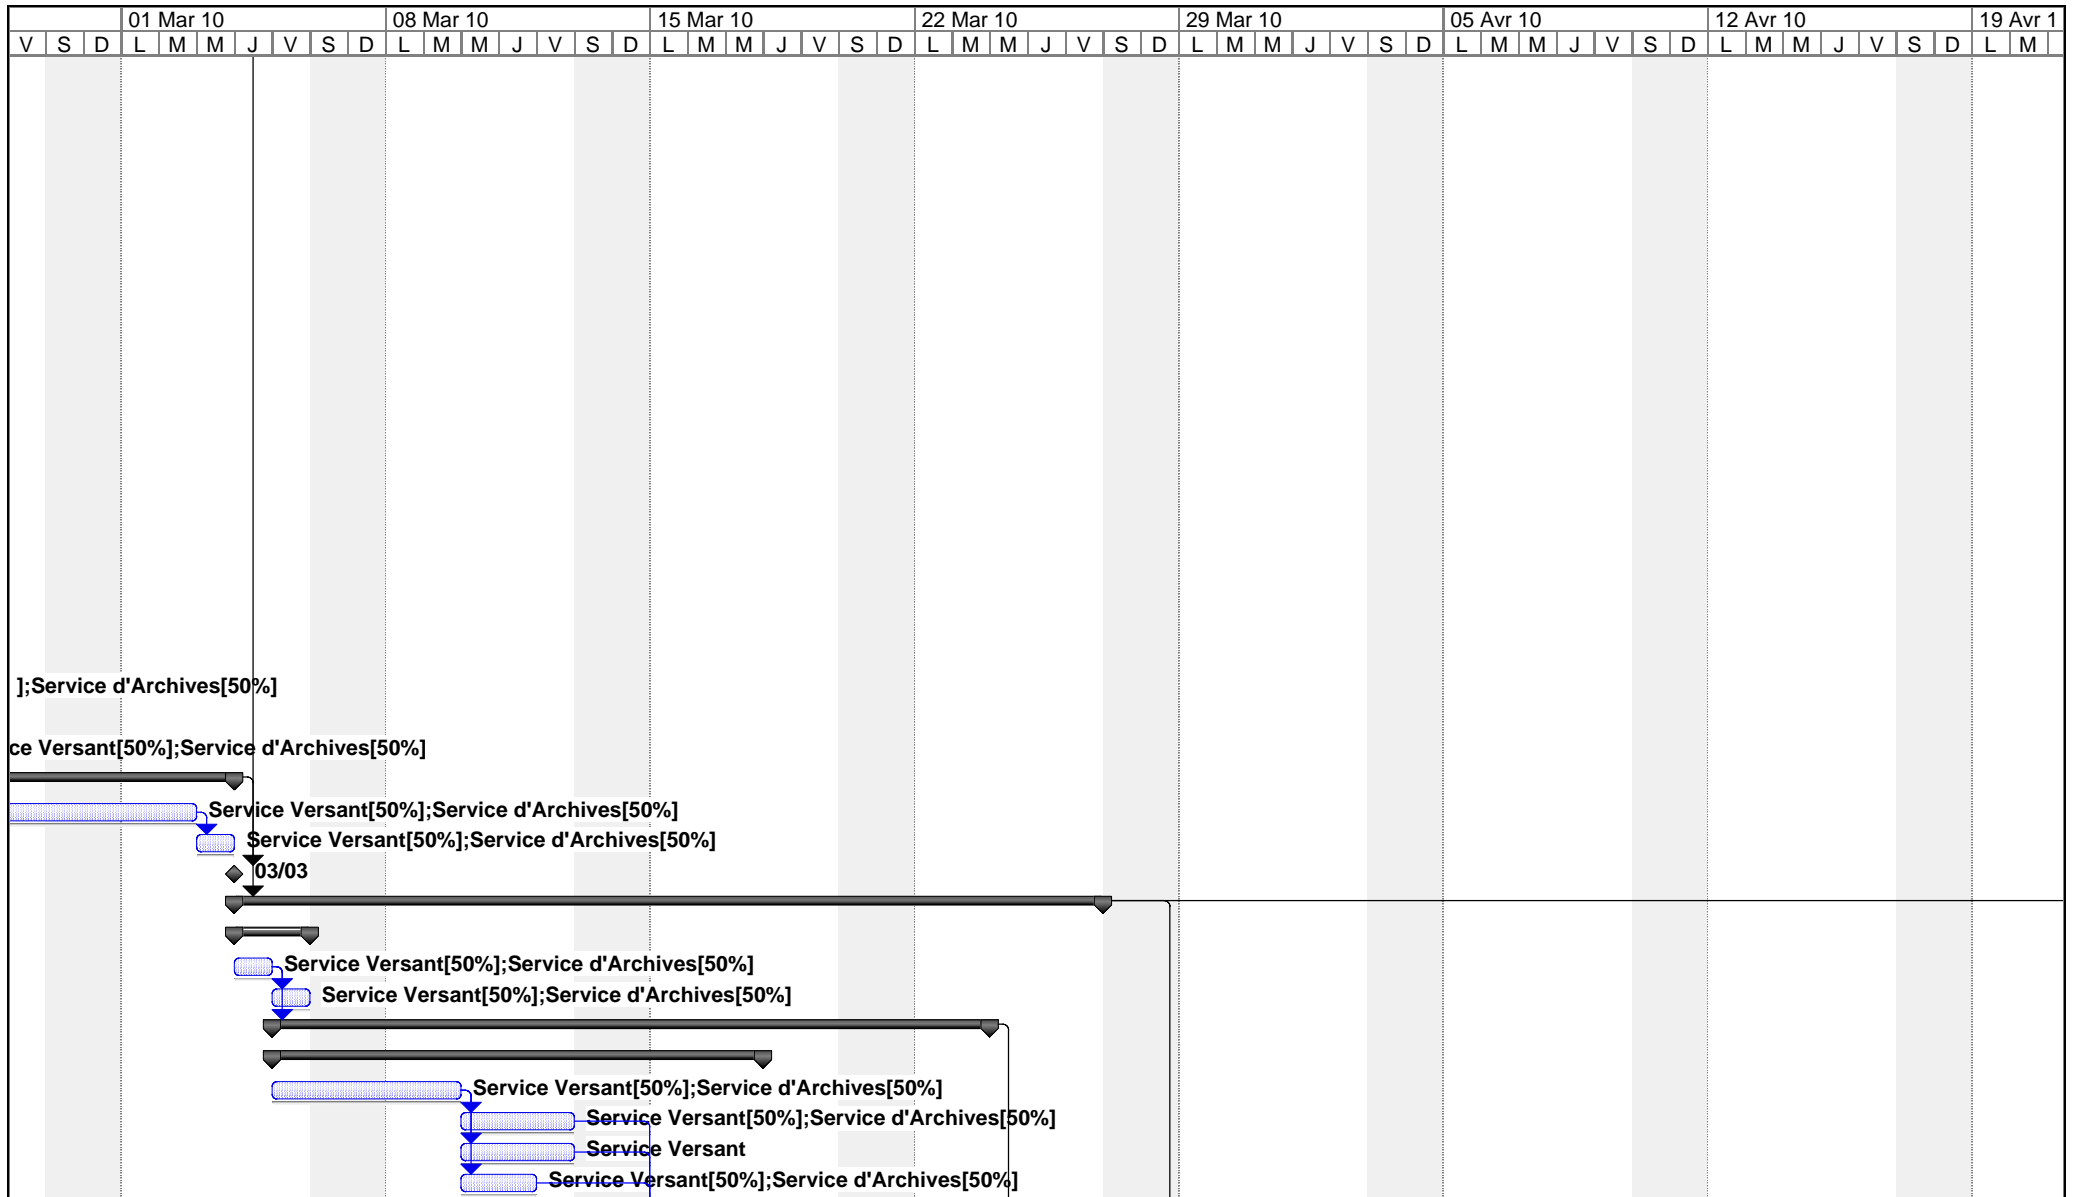


Projet : PAIMAS_Planning_phases
Date : Jeu 07/10/10

Tâche		Jalon		Tâches externes	
Fractionnement		Récapitulative		Jalons externes	
Avancement		Récapitulatif du projet		Échéance	

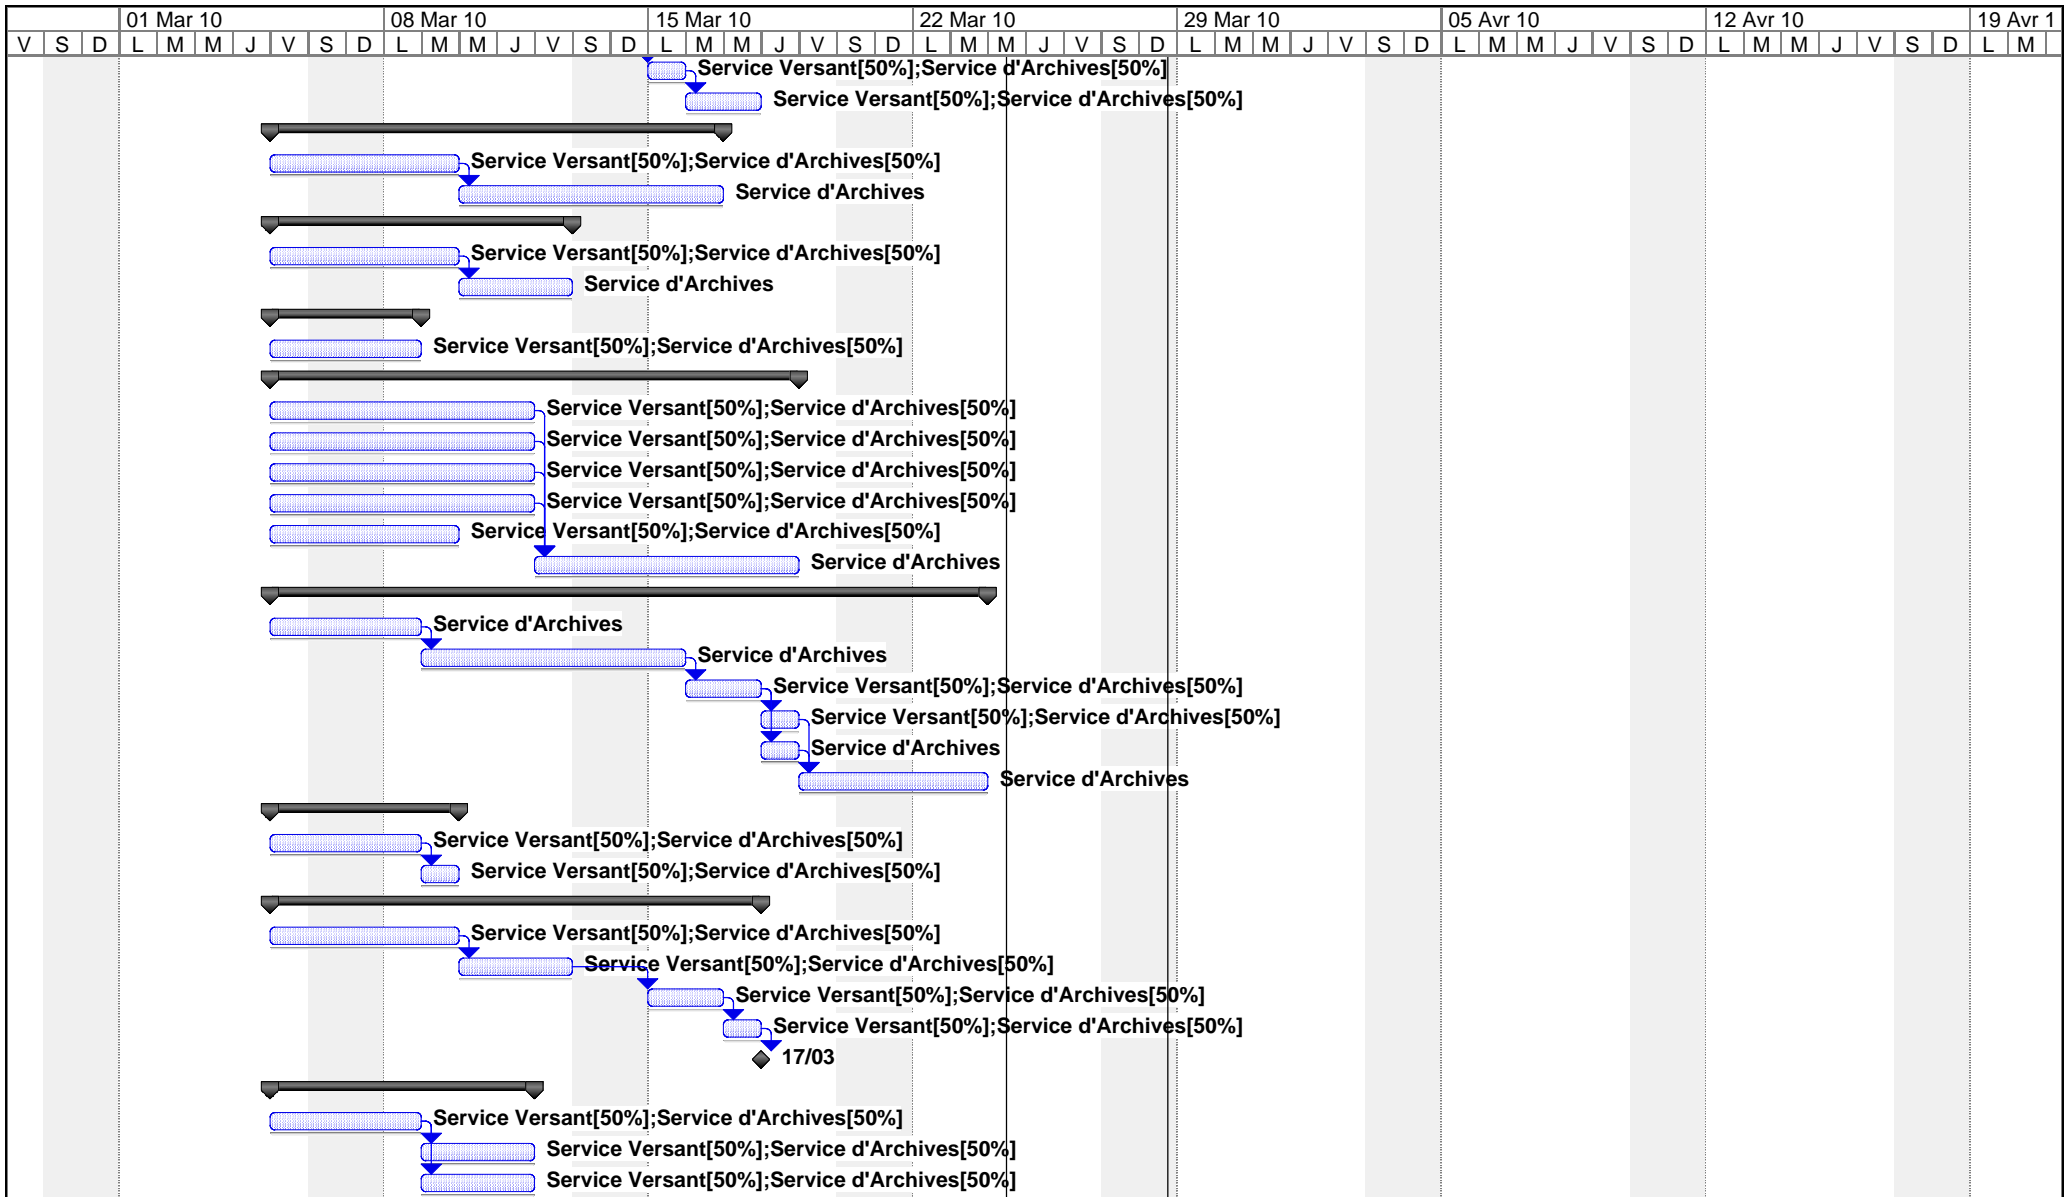


Projet : PAIMAS_Planning_phases
Date : Jeu 07/10/10

Tâche		Jalon		Tâches externes	
Fractionnement		Récapitulative		Jalons externes	
Avancement		Récapitulatif du projet		Échéance	

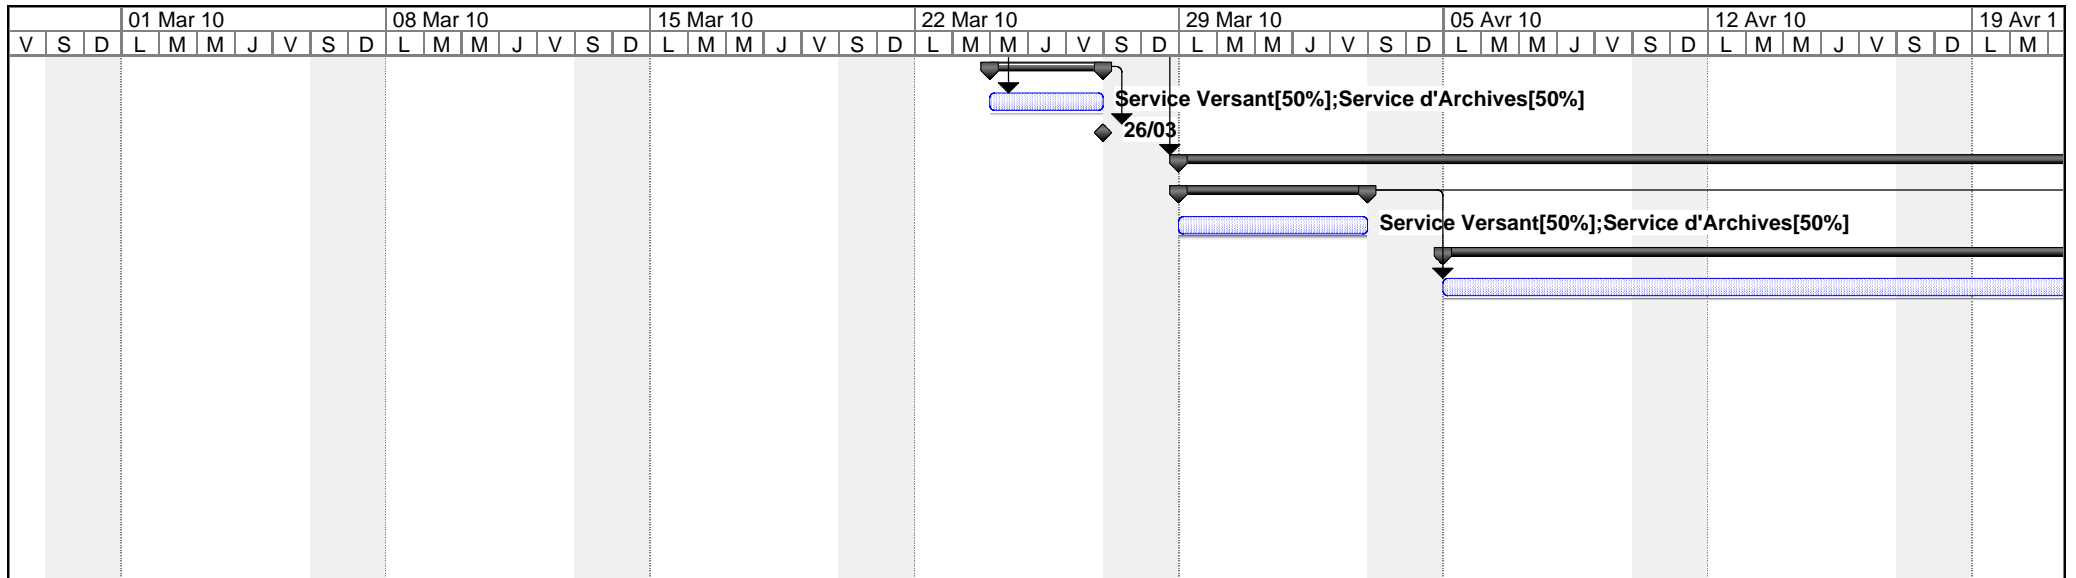


Projet : PAIMAS_Planning_phases
 Date : Jeu 07/10/10

- | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|--|-----------------|--|
| Tâche | | Jalon | | Tâches externes | |
| Fractionnement | | Récapitulative | | Jalons externes | |
| Avancement | | Récapitulatif du projet | | Échéance | |

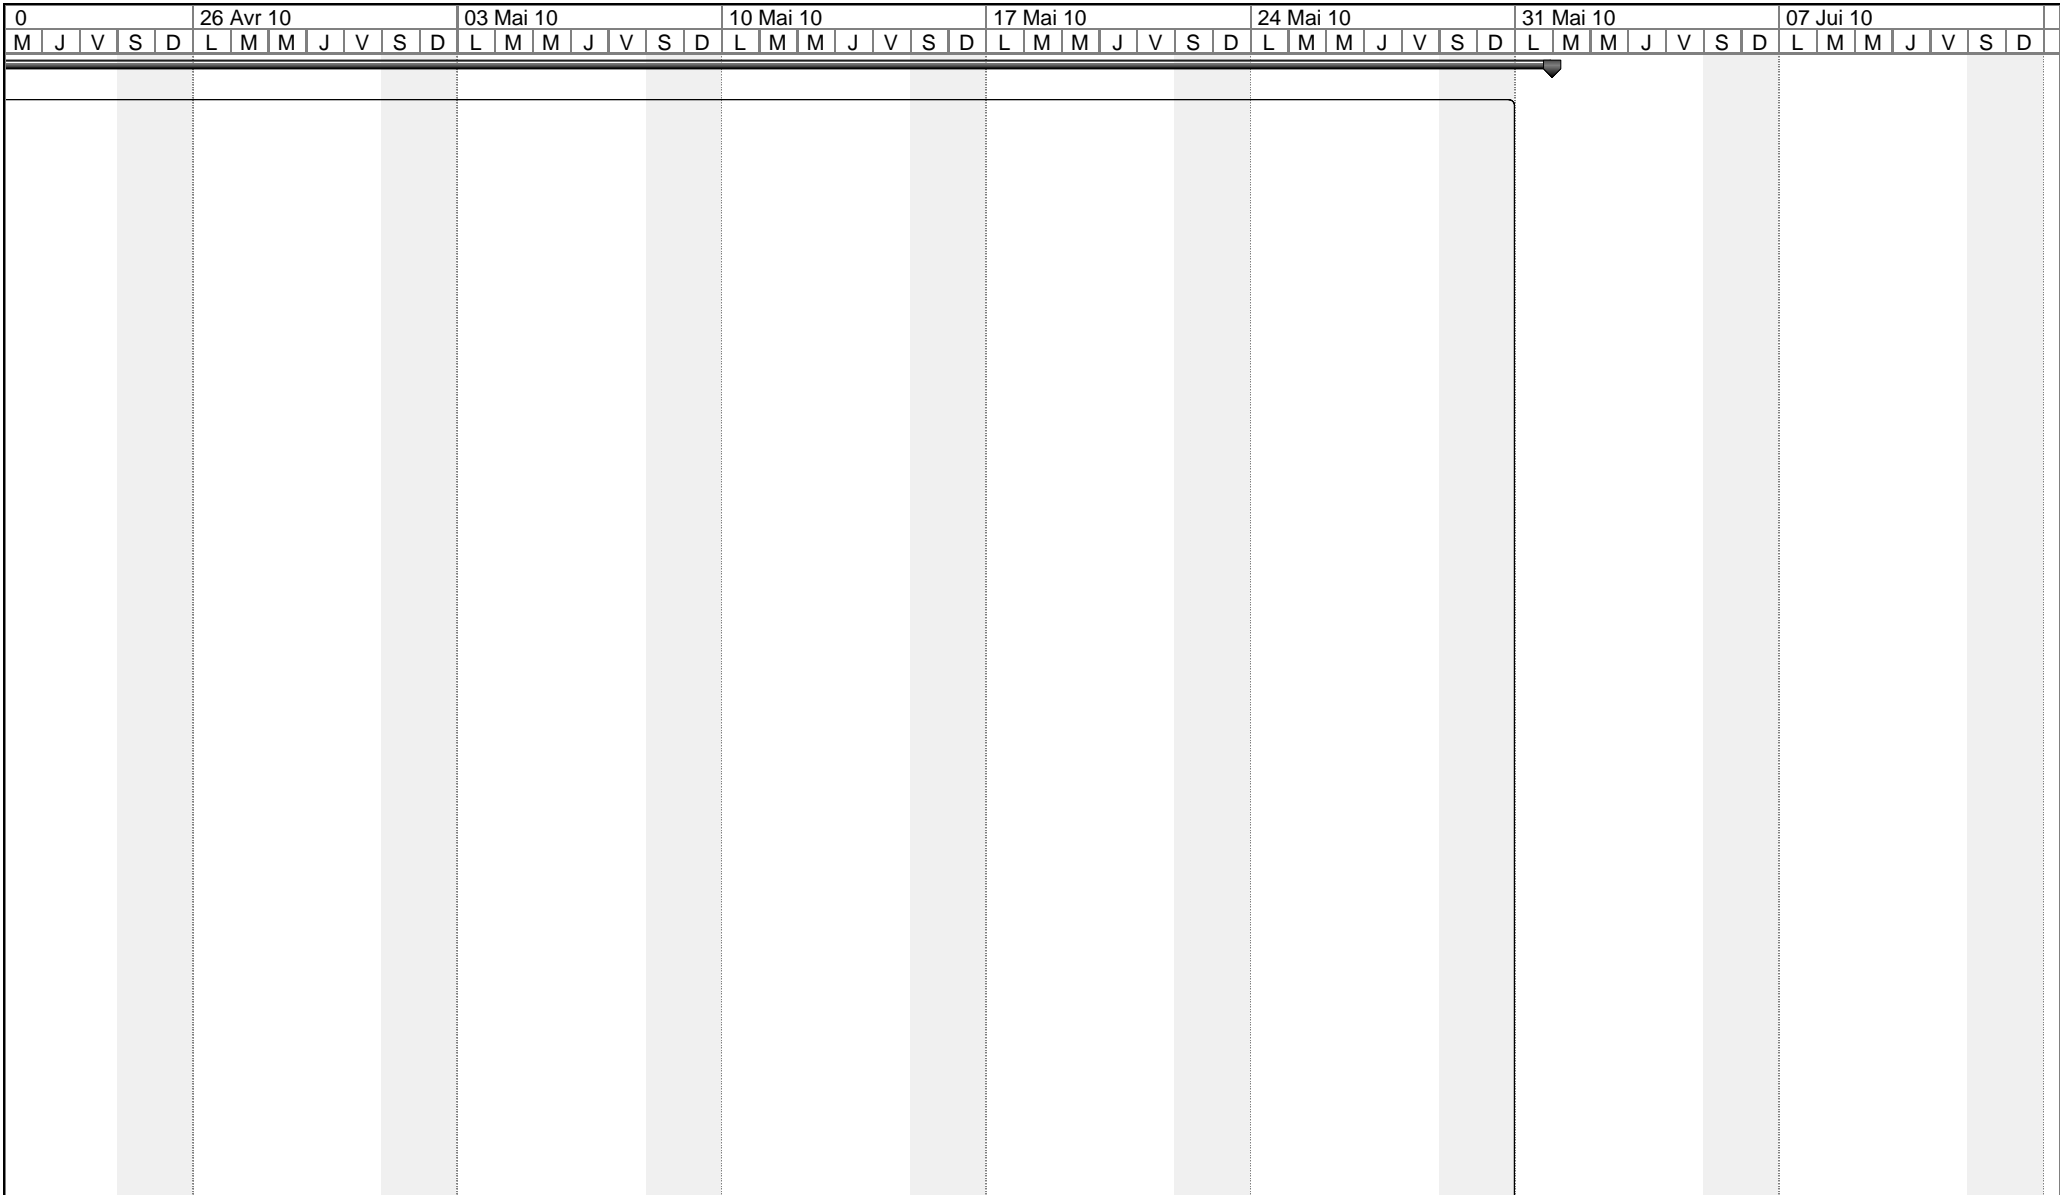

Projet : PAIMAS_Planning_phases
 Date : Jeu 07/10/10

Tâche		Jalon		Tâches externes	
Fractionnement		Récapitulative		Jalons externes	
Avancement		Récapitulatif du projet		Échéance	

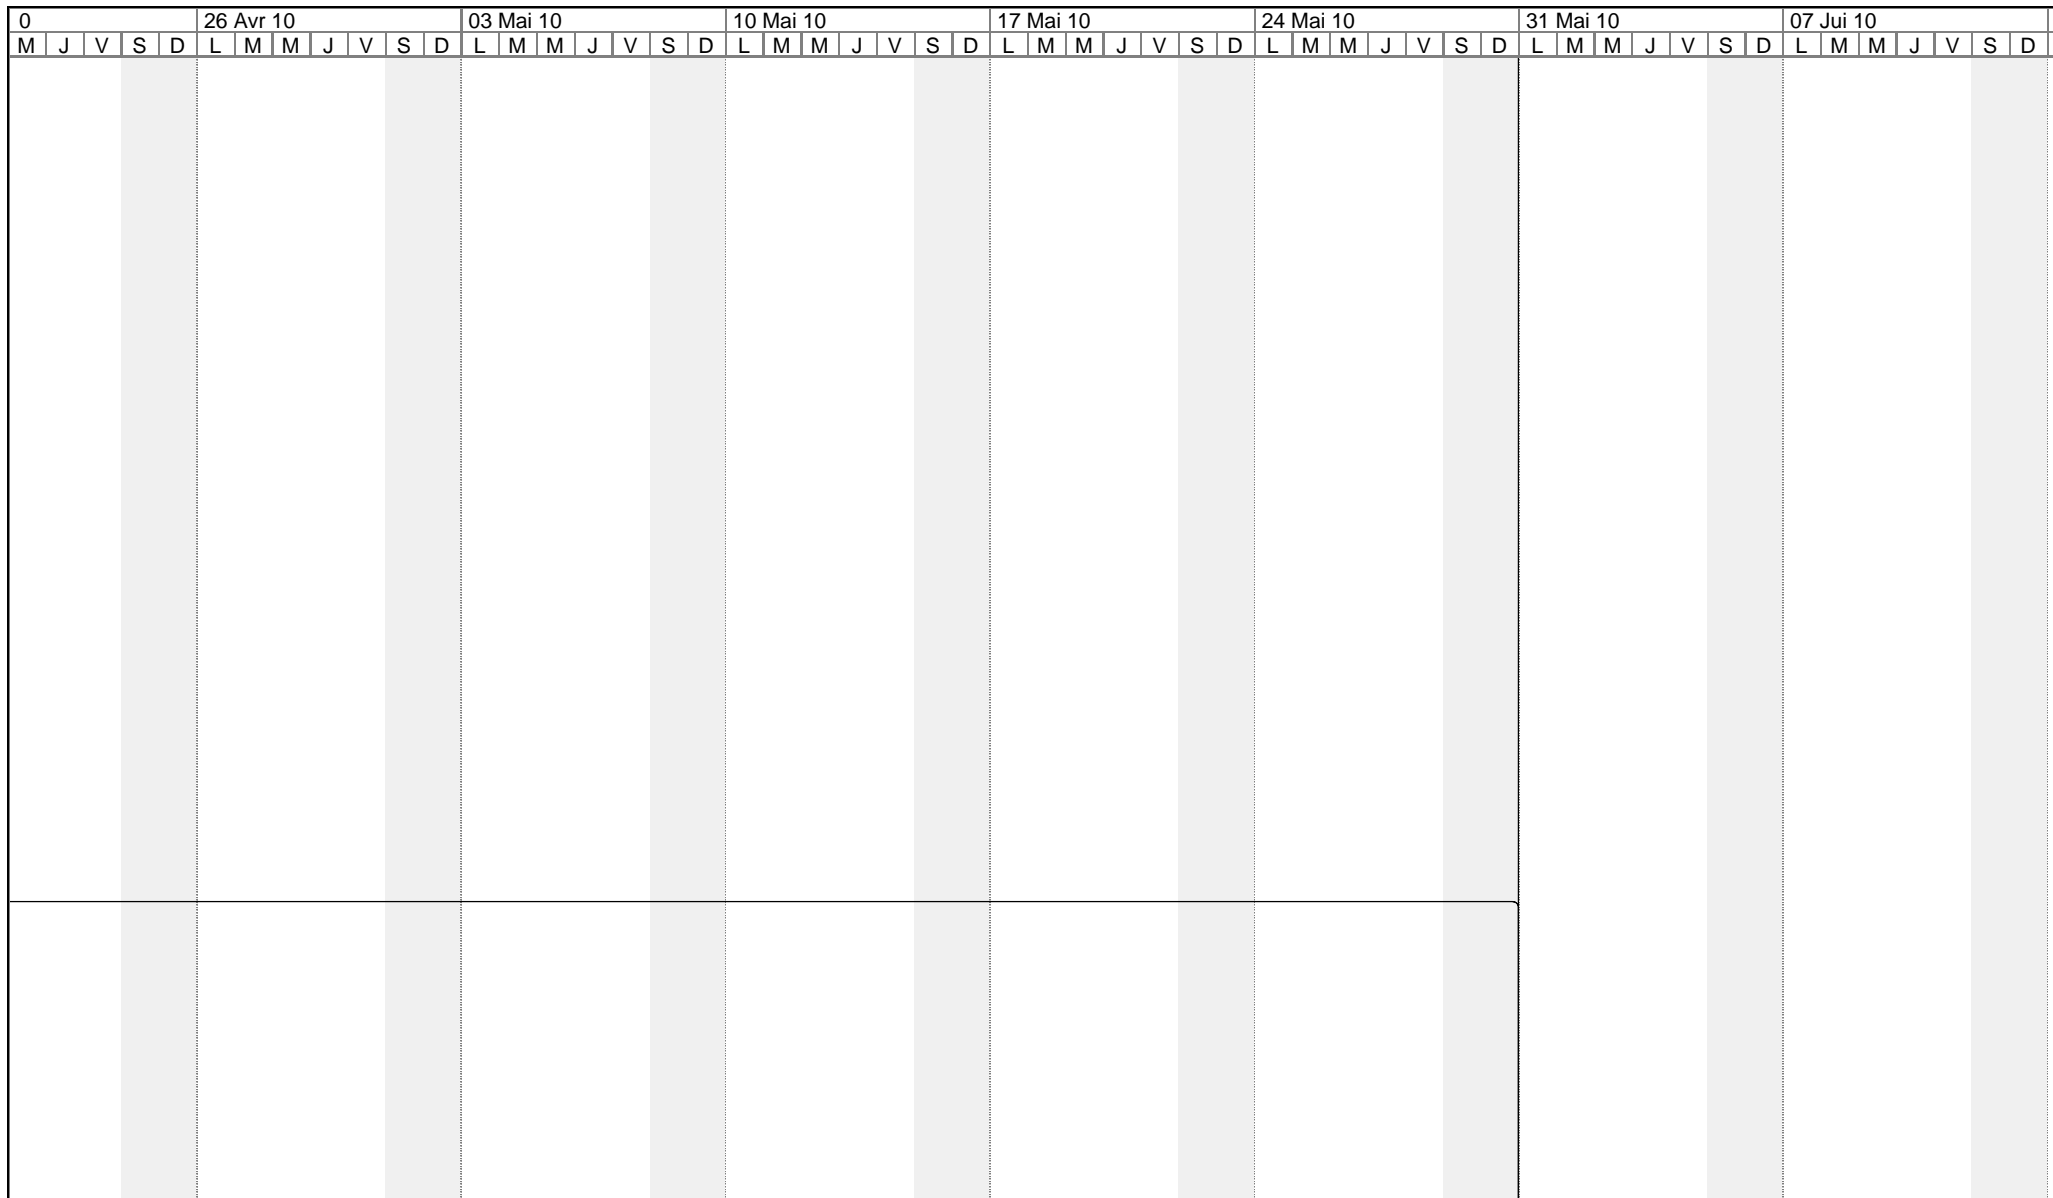










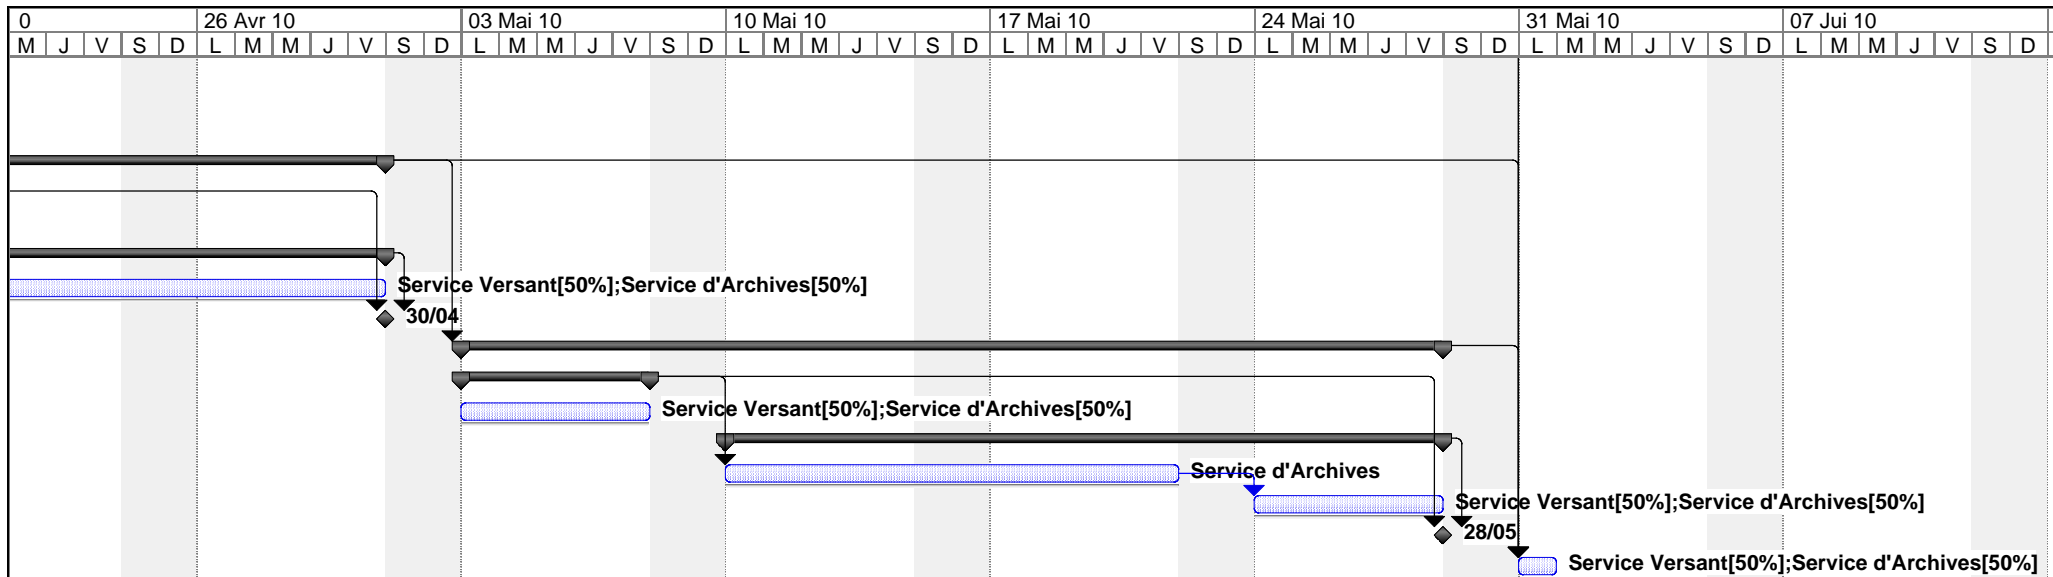
Projet : PAIMAS_Planning_phases
 Date : Jeu 07/10/10

- | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|--|-----------------|--|
| Tâche | | Jalon | | Tâches externes | |
| Fractionnement | | Récapitulative | | Jalons externes | |
| Avancement | | Récapitulatif du projet | | Échéance | |



Projet : PAIMAS_Planning_phases
Date : Jeu 07/10/10

- | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------|---|-----------------|---|
| Tâche |  | Jalon |  | Tâches externes |  |
| Fractionnement |  | Récapitulative |  | Jalons externes |  |
| Avancement |  | Récapitulatif du projet |  | Échéance |  |



Projet : PAIMAS_Planning_phases
Date : Jeu 07/10/10

Tâche		Jalon		Tâches externes	
Fractionnement		Récapitulative		Jalons externes	
Avancement		Récapitulatif du projet		Échéance	
